

# Réseau métropolitain *Osiris*

## Schéma du projet «fibres optiques»

### Légende

- FO posée
- GC disponible
- GC non disponible
- sites repères
- sites à raccorder

### Tracés Z (existants)

- Z1 : CRC - Observatoire
- Z2 : CRC - le 7 (rue de l'Université)
- Z3 : le 7 - Observatoire
- Z4 : Observatoire - PEGE
- Z5 : CRC - HUS

### Description du tracé Centre : A

- A1 : CROUS - BNUS
- A2 : CROUS - ENGEES
- A3 : CROUS - le 7

### Description du tracé Nord : B

- B1a : Koeberlé - Place Blanche
- B1b : Place Blanche - Wodli
- B2 : Wodli - PRO (rue Chappe)
- B3 a : PRO - SDIS
- B3 b : SDIS - Rotonde
- B4 : Rotonde - rue de Dossenheim
- B5 : rue de Dossenheim - rue St Florent
- B6 : rue St Florent - rue de Stutzheim
- B7 : rue de Stutzheim - rue du Loess
- B8 : rue du Loess
- B9 : rue de Stutzheim
- B10 : rue d'Oberhausbergen - CHU
- B11 : Wodli - Rectorat

### Description du tracé Sud : C

- C1 : Koeberlé - Chaufferie
- C2 : Chaufferie - Gaz
- C3 : Gaz - Colonne
- C4 : Colonne - Pont des Vignes
- C5 : Pont des Vignes - API

### Description du tracé Est : D


- D1 : Koeberlé - Porte de l'Hôpital
- D2 : Porte de l'Hôpital - rue de Palerme
- D3 : rue de Palerme - Pont d'Anvers
- D4 : Pont d'Anvers - Pont de l'Europe
- D5 : rue de Palerme
- D6 : Pont de l'Europe - caserne française

### Description du tracé F

- F1 : Bourse - IUFM
- F2 : IUFM - IPST

### Description du tracé E

- E : PEGE - Pont d'Anvers

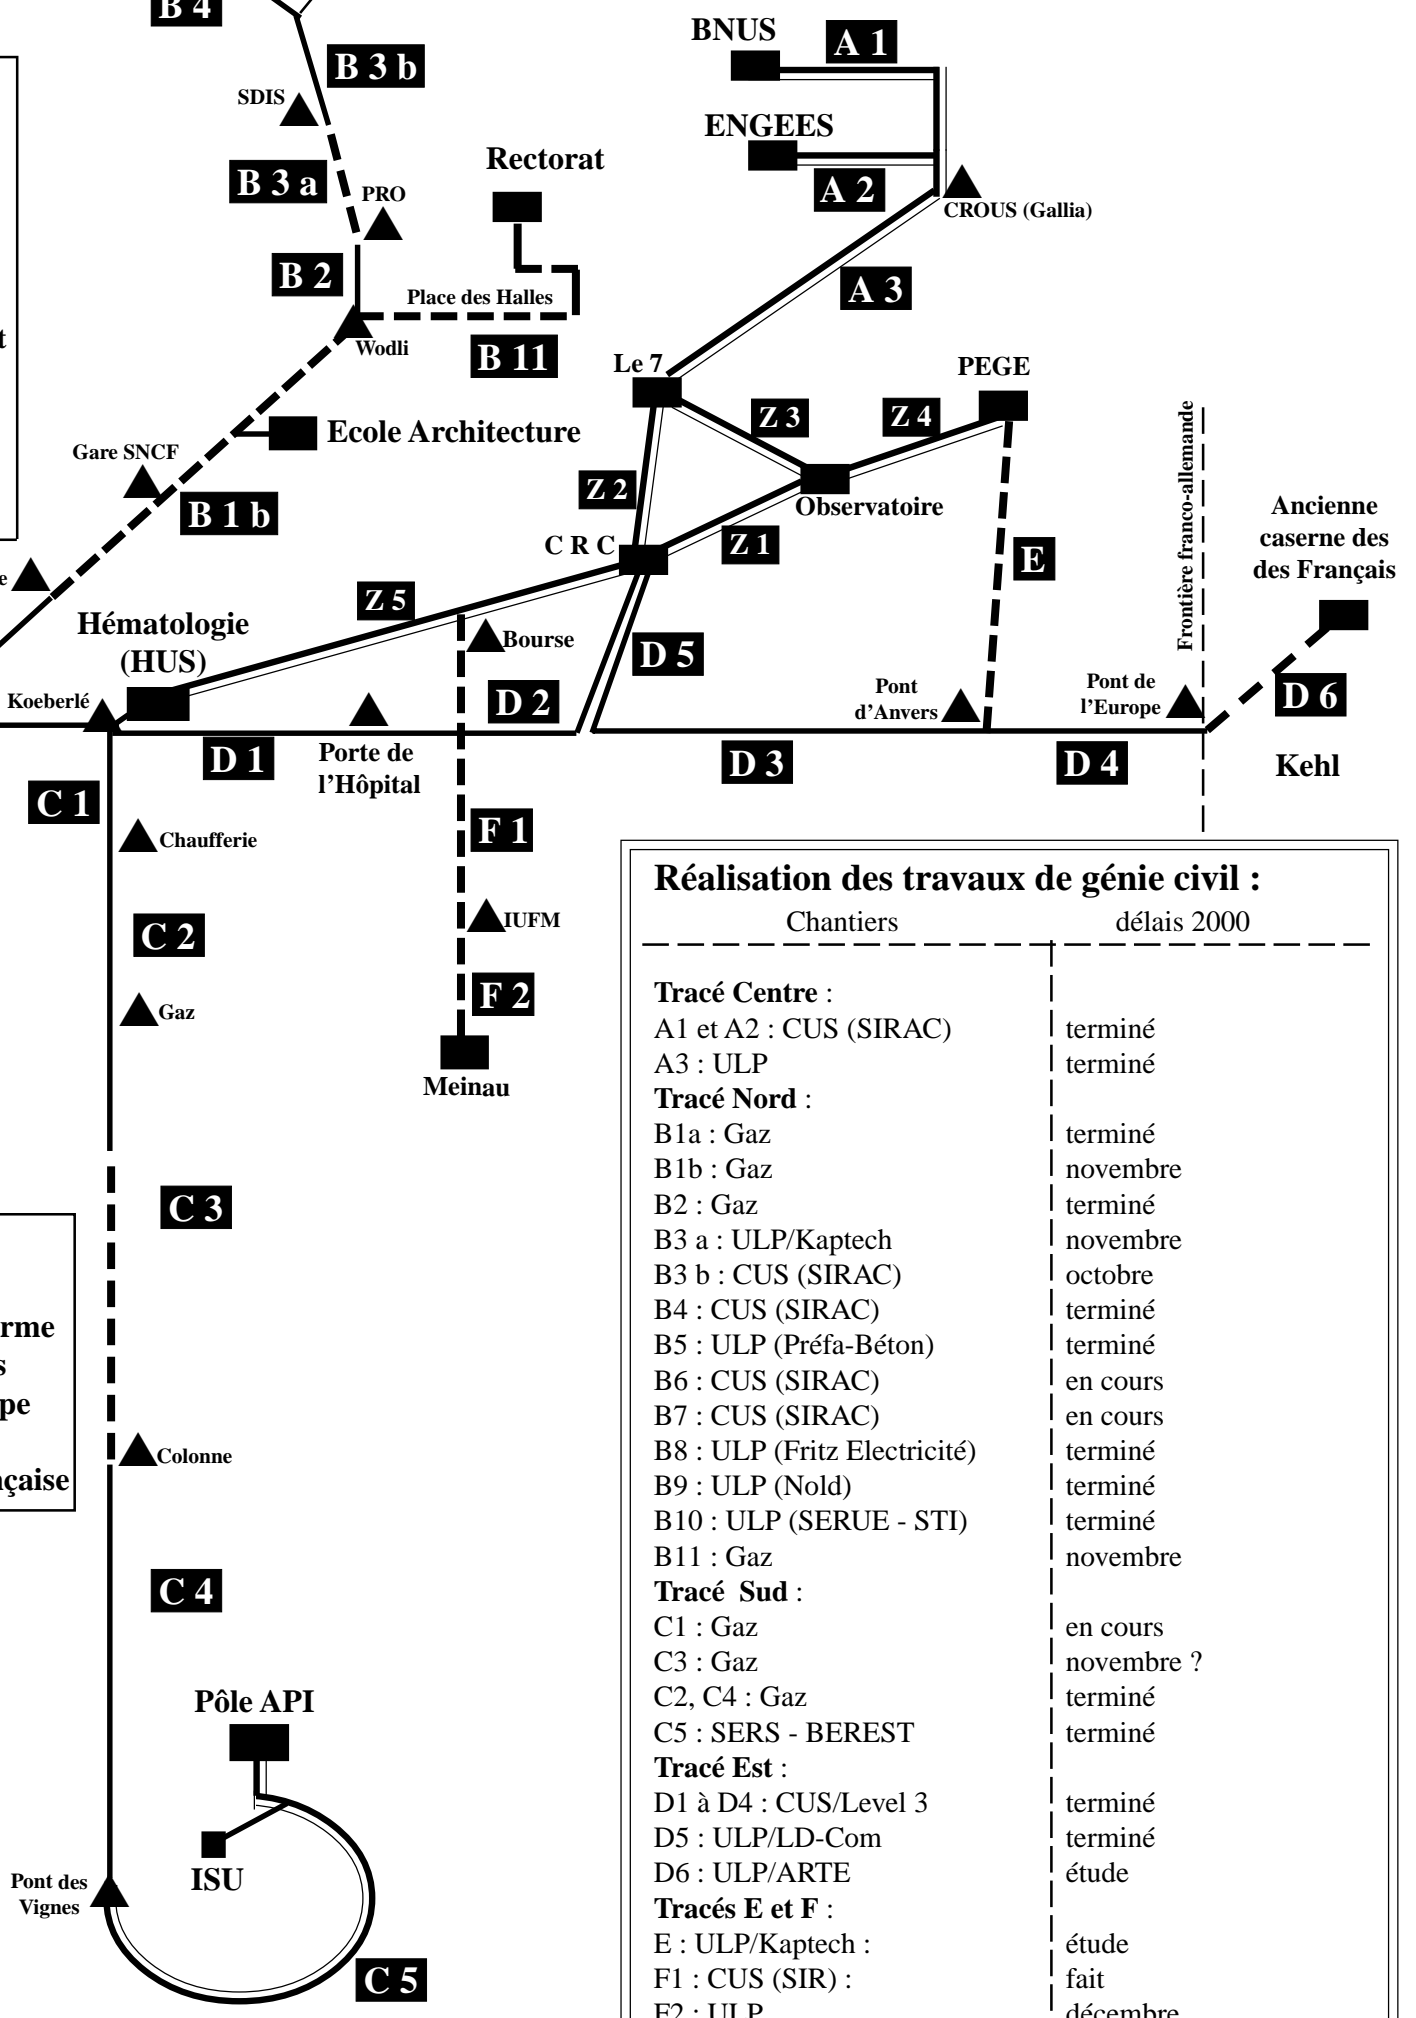

### Réalisation des travaux de génie civil :

Chantiers	délais 2000
<b>Tracé Centre :</b>	
A1 et A2 : CUS (SIRAC)	terminé
A3 : ULP	terminé
<b>Tracé Nord :</b>	
B1a : Gaz	terminé
B1b : Gaz	novembre
B2 : Gaz	terminé
B3 a : ULP/Kaptech	novembre
B3 b : CUS (SIRAC)	octobre
B4 : CUS (SIRAC)	terminé
B5 : ULP (Préfa-Béton)	terminé
B6 : CUS (SIRAC)	en cours
B7 : CUS (SIRAC)	en cours
B8 : ULP (Fritz Electricité)	terminé
B9 : ULP (Nold)	terminé
B10 : ULP (SERUE - STI)	terminé
B11 : Gaz	novembre
<b>Tracé Sud :</b>	
C1 : Gaz	en cours
C3 : Gaz	novembre ?
C2, C4 : Gaz	terminé
C5 : SERS - BEREST	terminé
<b>Tracé Est :</b>	
D1 à D4 : CUS/Level 3	terminé
D5 : ULP/LD-Com	terminé
D6 : ULP/ARTE	étude
<b>Tracés E et F :</b>	
E : ULP/Kaptech :	étude
F1 : CUS (SIR) :	fait
F2 : ULP	décembre
